

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/11/2021

Inspecteur: Wesley Carels

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481223

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Molenheide
Huisnummer	60
Busnummer	0.4
Postcode	2870
Gemeente	Puurs
Land	België

Eigenaar

Naam	Via immo
Straatnaam	Molenheide
Huisnummer	60
Busnummer	0.4
Postcode	2870
Gemeente	Puurs
Land	België

Installateur


Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860018118470

Teller Nr.: : 1sag1100076833

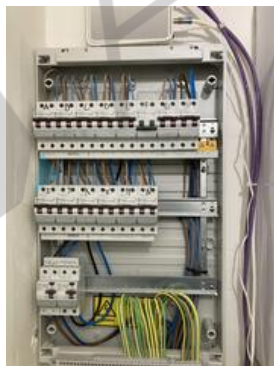

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 14

Ri algemeen: 16,34 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 8,80 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
9	C	20		2	2,5
1	C	20	Vrij	2	-
3	C	16		2	1,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O19 Alle differentieelstroominrichtingen werden getest en in orde bevonden.
- O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 29/11/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Wesley Carels

De werknemer,
Wesley Carels
#113 - ACEG



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:



Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/11/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

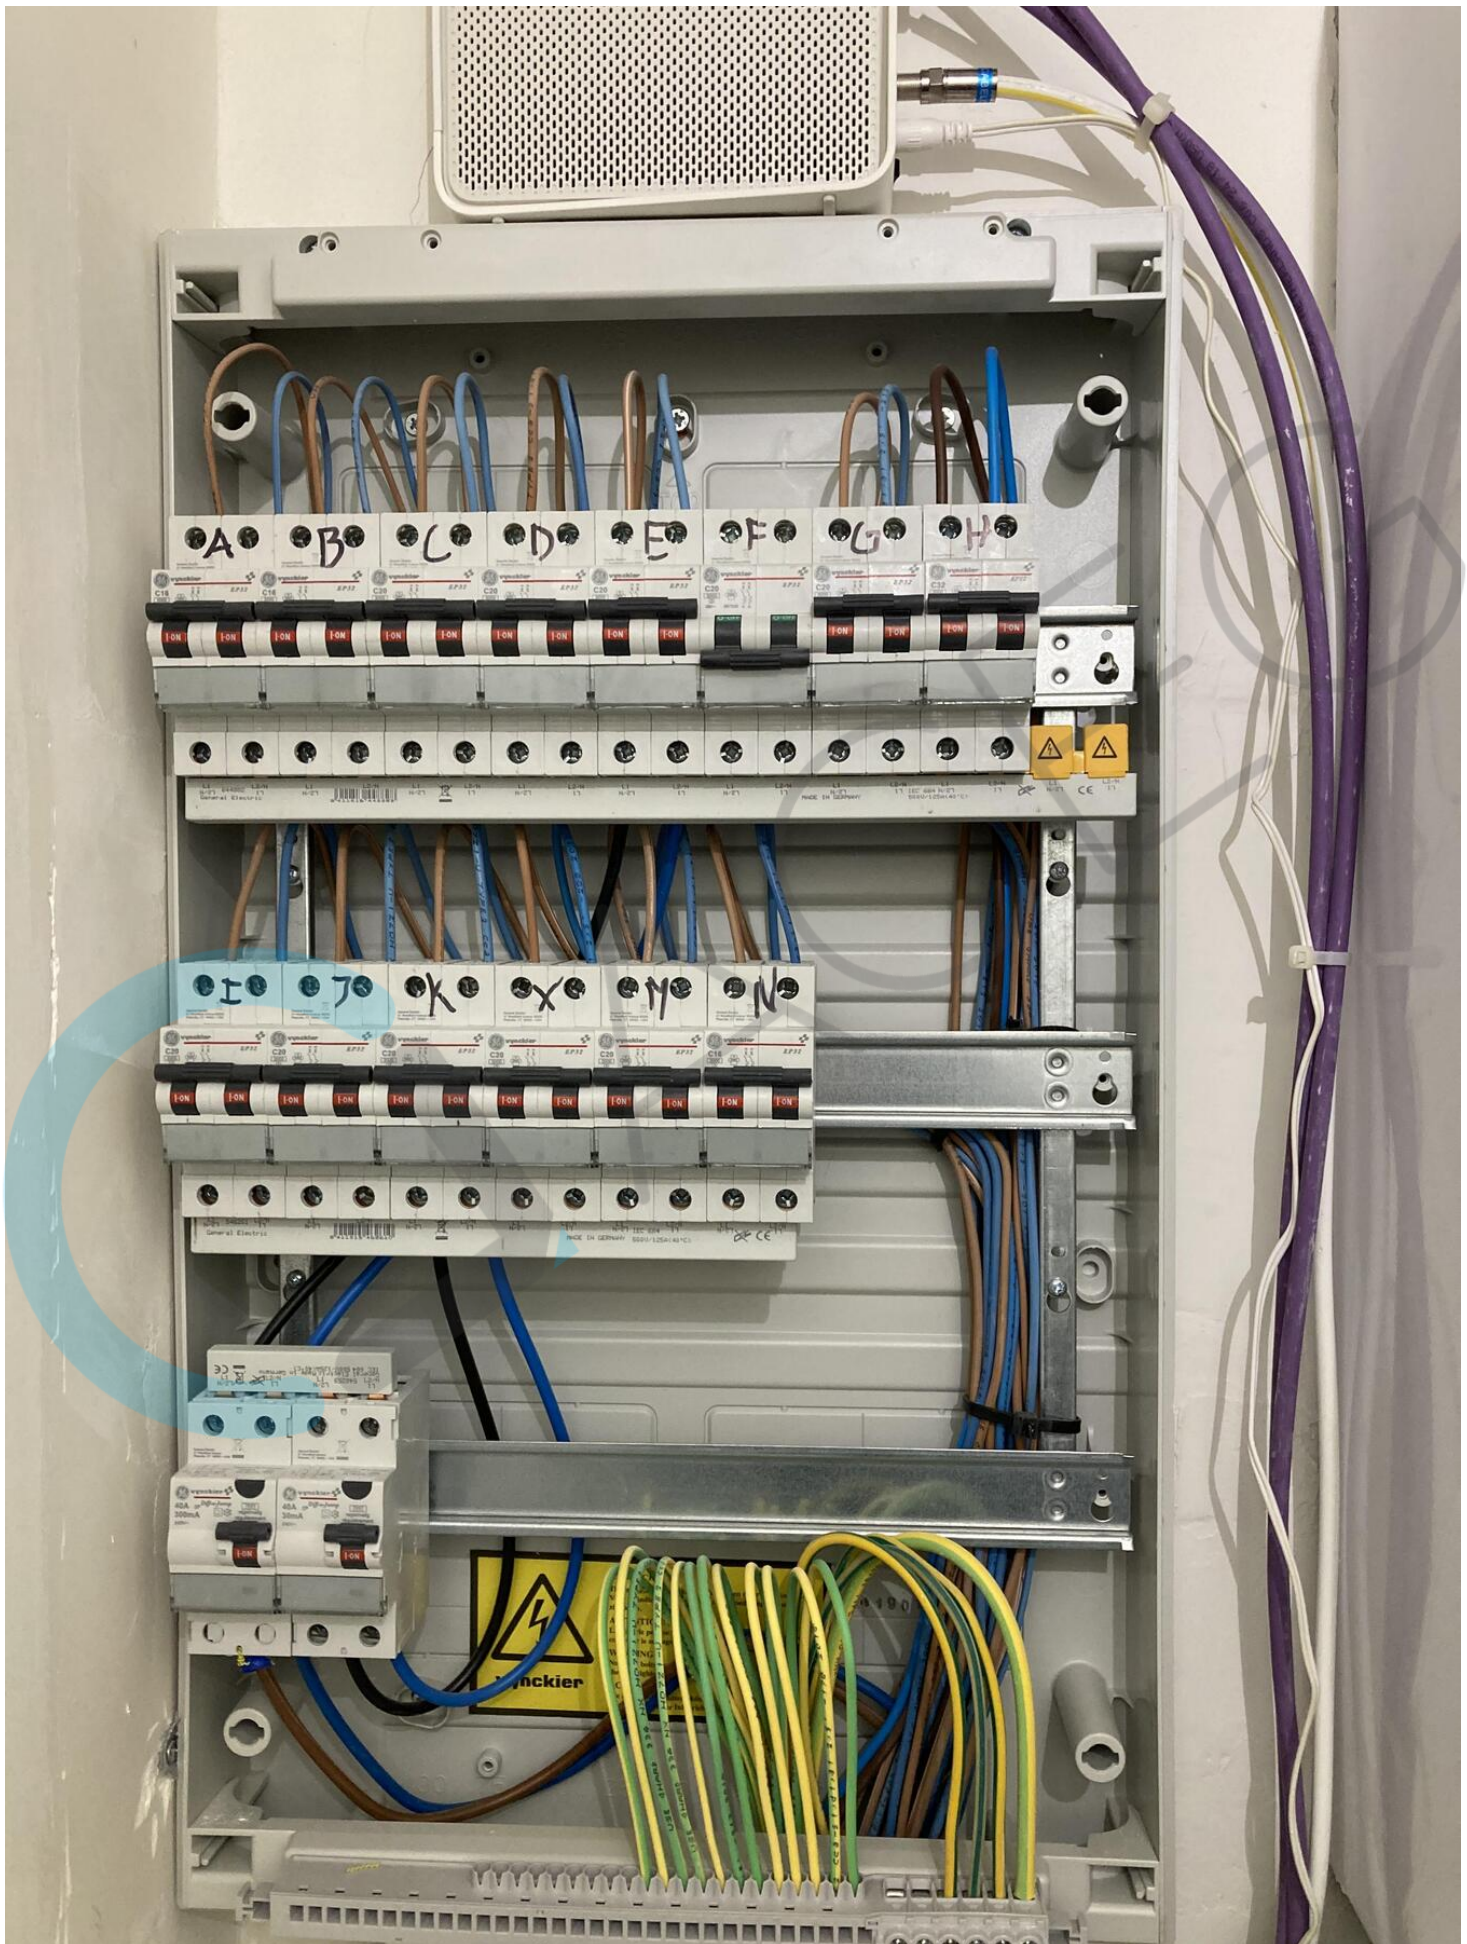




Verantwoordelijke voor de uitvoering	Appartement C0.02	Agevaardige erkend organisatie
CGM SVD	www.maris.tech	 MARIS 3650 HEUSDEN-ZOLDER Tel: (+32)011/432240 Fax: (+32)011/436830
Datum: 14/10/2018	Projectnummer: 20181083	
Boltic Breeendonck		

Brandkleppen?

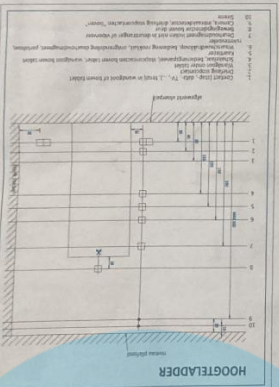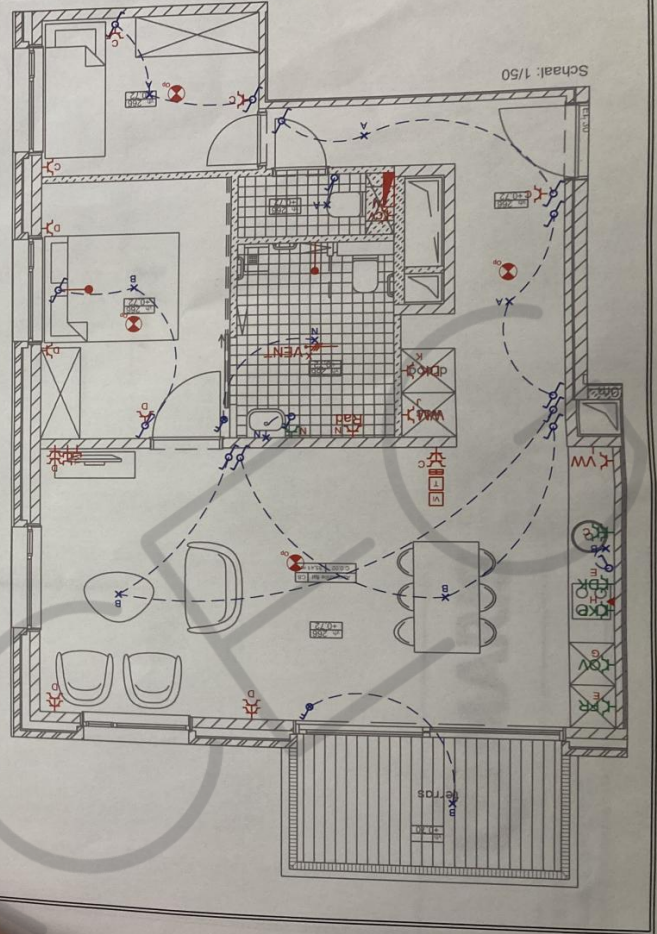



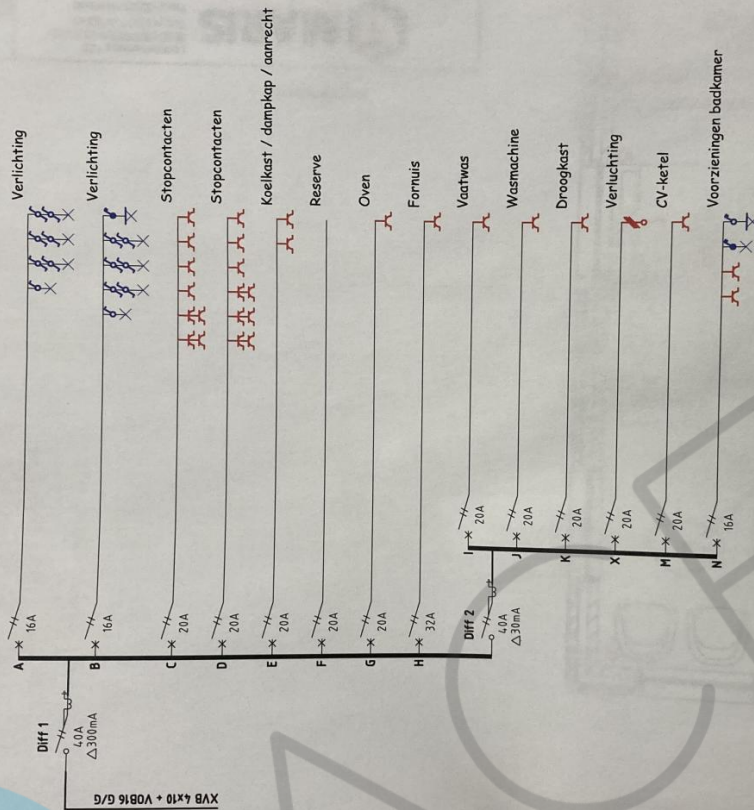

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: (+32)011/432240
Fax: (+32)011/436830
www.maris.tech



Eéndraadschema
Appartement C 0.02

Botanic Breendonk

Projectnummer: 20181093

Datum: 23/10/2019

Get: SVD

Schaal:

Tekeningnummer:



